

大牟田・荒尾清掃施設組合 新ごみ処理施設建設だより (NO.3) 発行：令和7年7月

大牟田・荒尾清掃施設組合では、福岡県大牟田市と熊本県荒尾市の燃えるごみ処理施設の管理運営と新施設の建設を行っています。「建設だより」では、令和10年7月の供用開始に向け整備を進めている新ごみ処理施設の整備状況について情報発信していきます。



6月時点の建設用地の様子



4月より行っておりました杭工事は予定どおりに完了しました。

7月からの躯体工事・コンクリート打設工事に向け、6月は掘削工事と山留工事（掘削の際に地盤が崩れないように鋼矢板を打込んで押さえる工事）を行っております。

7月より躯体工事・コンクリート打設工事が始まります




イメージ図

新ごみ処理施設では7月より躯体工事、コンクリート打設工事を行っていく予定です。

コンクリート打設工事が始まりますと、ミキサー車等が1日に20台程度（11月以降は最大で150台程度）搬入出する予定です。（工事車両は、基本的に有明海沿岸道路を使用します。）

周辺にお住まいの皆様にはご迷惑をおかけするかと思いますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

工事工程

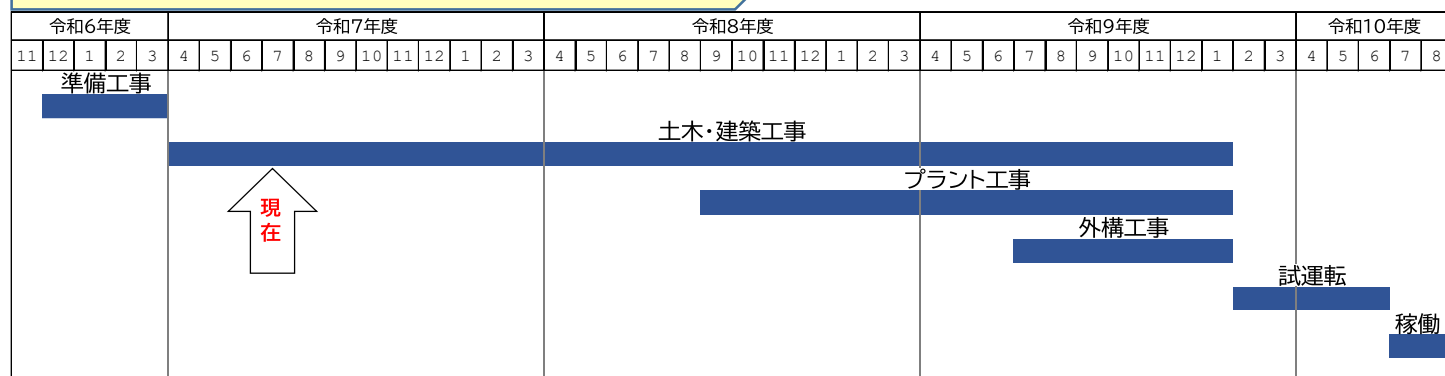

これからも、安全管理に万全を期して工事が順調に進むよう努めてまいります。

【発行元】

大牟田・荒尾清掃施設組合事務局
〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3
TEL・FAX:0944-41-2727
Email:e-rdfcenter@city.omuta.fukuoka.jp



工事の進捗状況はここからご覧いただけます。→

